


Harmonogram postupu stavebních prací

Stavba: Silnice III/32246 Kostěnice a Silnice III/34044 Kostěnice

Objednatel:
Zhotovitel:
Doba výstavby:
Termín zahájení:
Termín dokončení:

SÚS Pardubického kraje
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
40 kalendářních dní
06. 09. 2021
26. 11. 2021

Prováděné práce	Stroje	Lidi
Přípravné práce, geodetické vytyčení stavby, zajištění DIR (DIO), vytyčení inženýrských sítí		
Silnice III/32246 Kostěnice (od JZD - výjezd z obce směr Dašice)		
Čištění uličních vpustí, 44 ks	CASE	2
Čištění krajnice	JCB+Tatra	1
Nové uliční vpustí (2 x u KD, 2 x u OÚ)		
Frézování rýhy pro obrubníky (u Jednoty, u OÚ, u kulturního domu)	sub, 1xTatra	1
Celoplošné frézování vozovky, od KÚ(JZD)k Obecnímu úřadu, 5500 m ²	sub, 4xTatra	2
Sanace kraje vozovky, 280 m ²	UDS+Tatra	2
Dorovnání podkladů vozovky po frézování	UDS+Tatra	2
Výměna obrubníků (lokálně)	CASE, minibagr, Tatra	2
Nároží křížovky k nádraží, silniční obruby	CASE, minibagr, Tatra	2
Nároží křížovky k nádraží, velké kostky	sub	
Obrubníky u kulturního domu	CASE, minibagr, Tatra	3
Pokládka asfaltu u KD	pokládka	
Cementová stabilizace rýhy po kanalizaci od křížovky k nádraží a ZÚ směr na Dašice	Otoč, 2xTatra	2
Asfaltové vrstvy ACP 16, tl. 60, 5500 m ² od KÚ (JZD)-OÚ	pokládka	
Asfaltové vrstvy ACO 11, tl. 40, 5800 m ² od KÚ (JZD)-OÚ	pokládka	
Frézování vozovky od Obec úřadu-ZÚ(směr Dašice)cca 4800 m ²	sub, 4xTatra	2
Obrubníky u Jednoty + OÚ	sub	
Pokládka dlažby u Jednoty + OÚ		
Dorovnání podkladů vozovky po frézování		2
Asfaltové vrstvy ACP 16, tl. 60, 5500 m ² od OÚ-ZÚ směr Dašice	pokládka	
Asfaltové vrstvy ACO 11, tl. 40, 5800 m ² od OÚ-ZÚ směr Dašice	pokládka	
Krajnice	JCB+Tatra	2
Dopravní značení	sub	
Dokončovací práce	CASE	4
Silnice III/34044 Kostěnice (k nádraží ČD směr Hostovice)		
Čištění uličních vpustí, 5 ks	CASE	2
Čištění krajnice	JCB+Tatra	1
Uliční vpust', 2 ks + přípojka	CASE, minibagr, Tatra	2
Výkop rýhy pro silniční obrubníky	CASE, minibagr, Tatra	1
Silniční obrubníky, 157 m	CASE	3
Výkop rýhy pro žlaby	CASE, minibagr, Tatra	1
Odvodňovací žlaby+obrubníky podél, 246 m	CASE	3
Frézování vozovky	sub, 4xTatra	2
Recyklace vozovky za studena	sub, 2xTatra	
Asfaltové vrstvy ACP 16, tl. 60, 4500 m ²	pokládka	
Asfaltové vrstvy ACO 11, tl. 40, 4500 m ²	pokládka	
Krajnice	JCB+Tatra	2
Dokončovací práce	CASE, Tatra	4

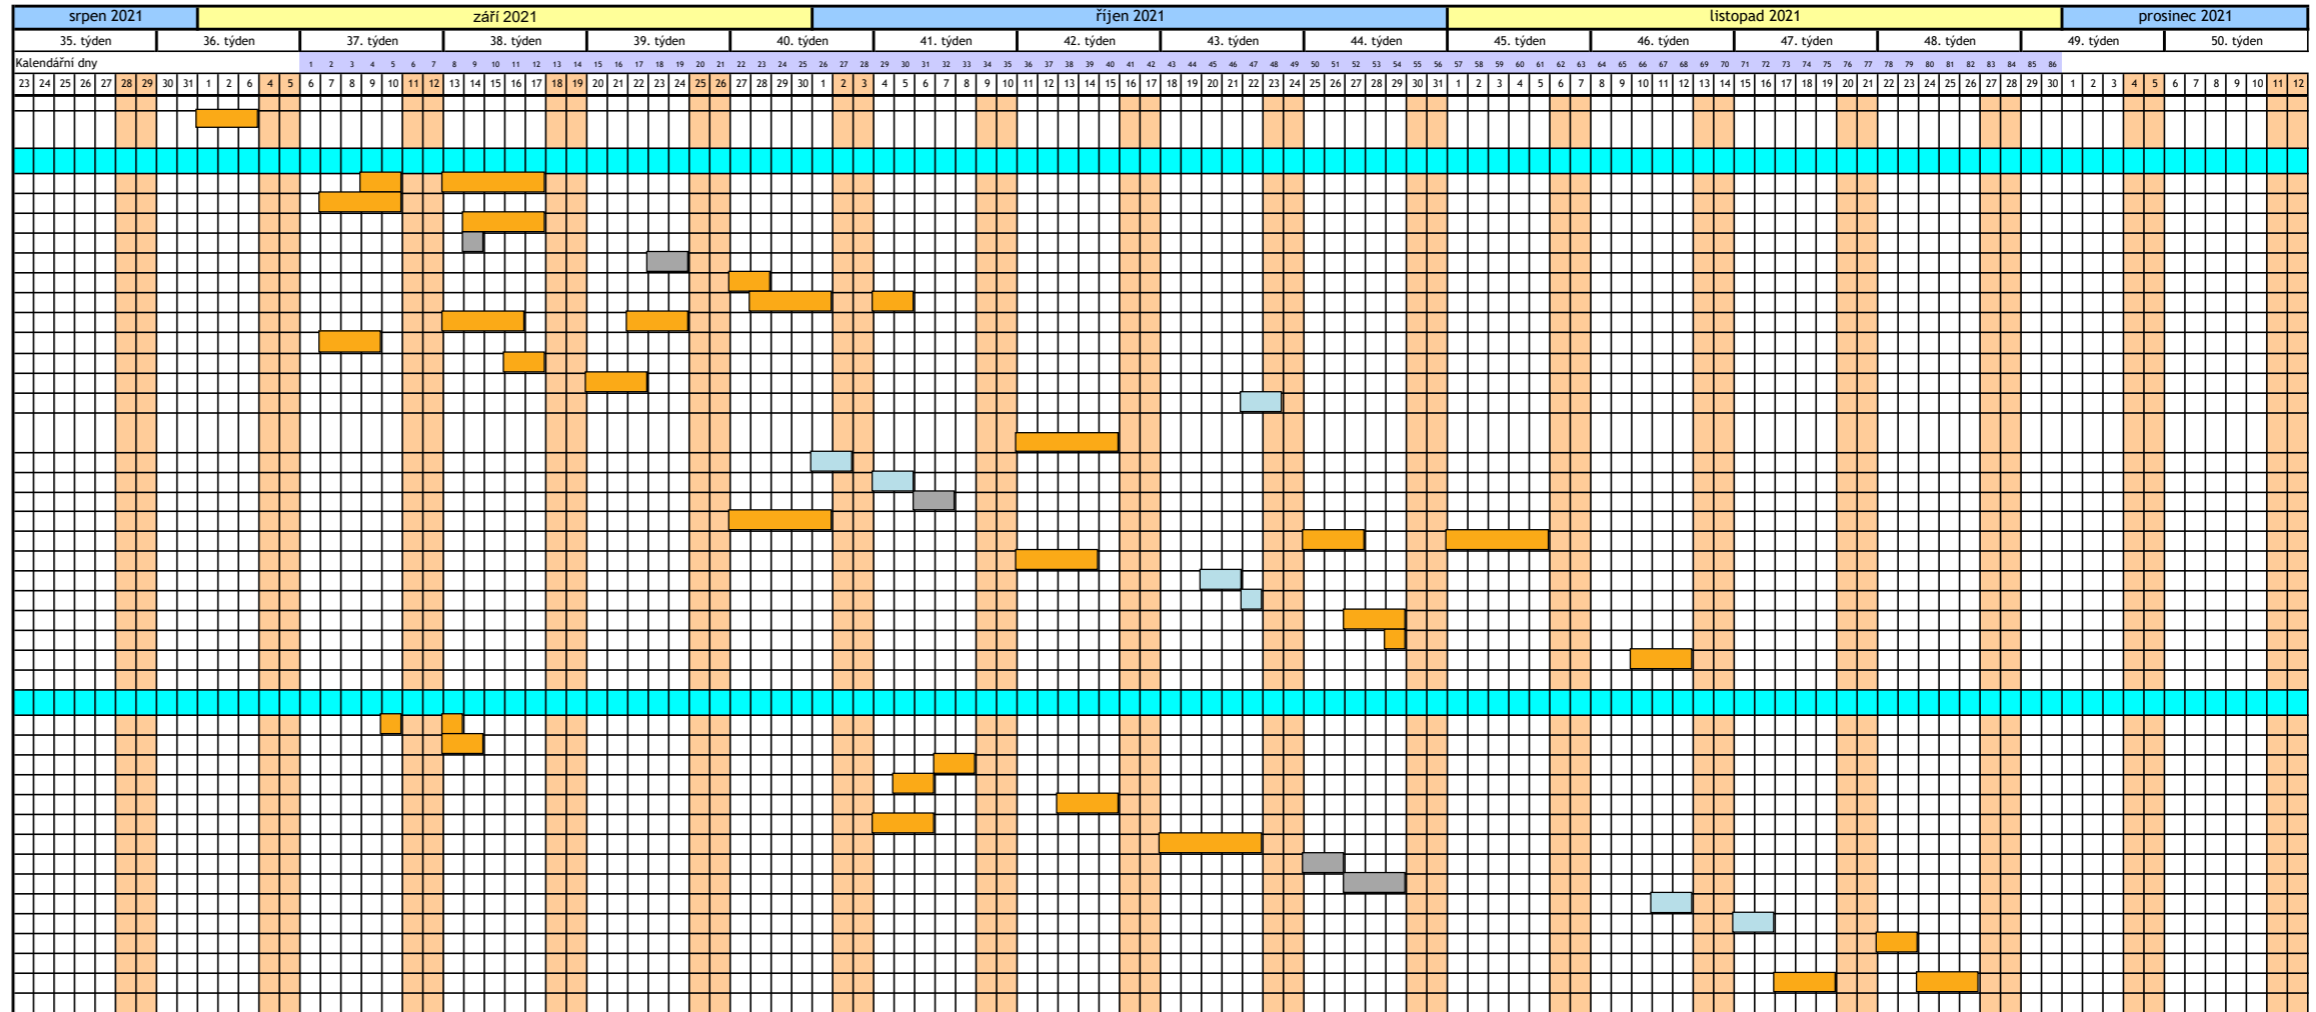

Vypracoval: Ing. Lukáš Vondra


Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice - Zelené Předměstí,
 K Vápence 2677, PSČ 530 02
 IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
 +420 466 791 111 www.cht-pce.cz
